

Управление распределённой командой

Пошаговая стратегия локализации кризиса и восстановления контроля
при систематическом срыве сроков

Выполнила: Олеся (deandrah) “Школа 21”


| Термин и специфика формата

Распределённая команда (Distributed Team)

Команда, члены которой физически находятся в разных локациях, городах, странах или часовых поясах.

Ключевые отличия от обычной удалёнки:

- 🕒 Разница во времени и асинхронность коммуникаций
- 🚫 Полное отсутствие спонтанного очного общения
- 💬 Опора исключительно на цифровые инструменты (Zoom, Slack)
- 🧠 Критическая зависимость от самоорганизации сотрудников

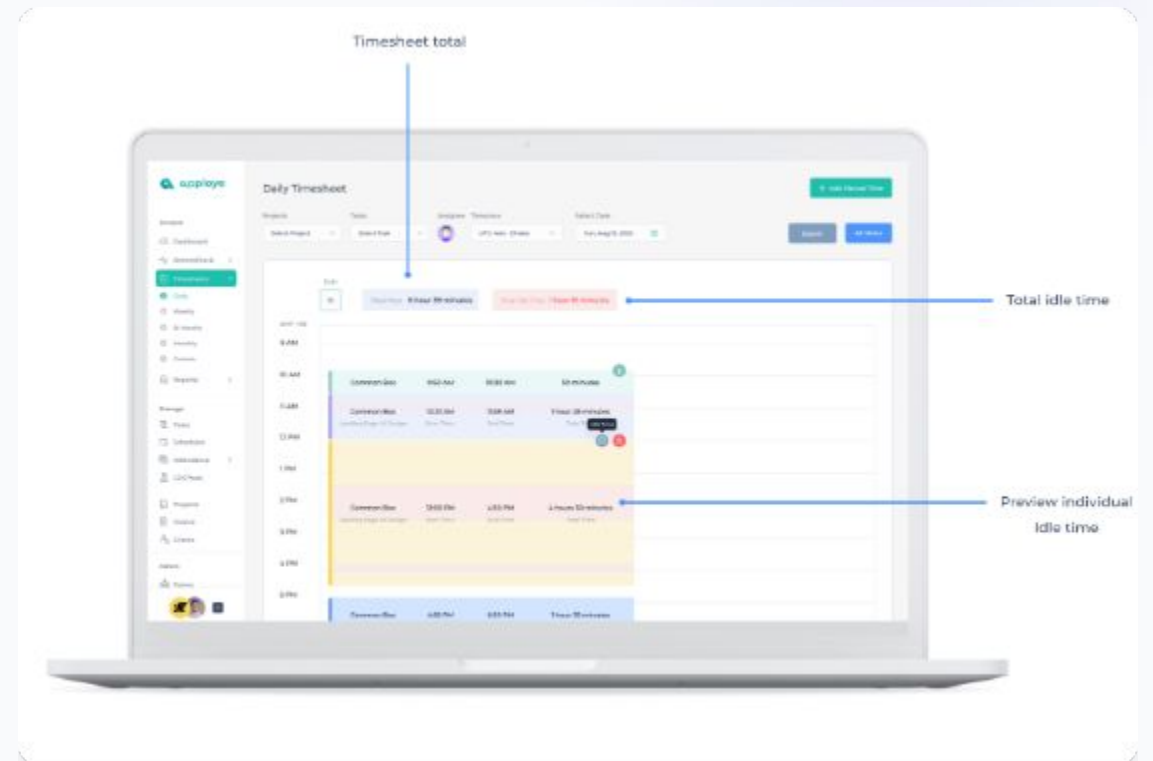

| Исходные данные и проблема

Контекст проекта

🏢 **Компания:** веб-студия (функциональная структура)

👥 **Команда:** 6-7 специалистов (дизайнер, разработчики, QA, PM, аналитик)

⚠️ Проблема с дизайнером

Срывает сроки разработки макетов уже 2 недели. До релиза остался всего 1 месяц. Разработчики простаивают. Регулярно использует типичные отговорки («нет света», «нет интернета» и т.д.).

4 Types of Organizational Conflict (Levels)



| Матрица полномочий РМ

✓ я МОГУ	✗ я НЕ МОГУ
Ежедневно контролировать работу дизайнера и собирать статус	Уволить дизайнера самостоятельно (ограничение структуры)
Официально фиксировать факты невыполнения задач и отклонения	Нанять нового сотрудника на замену без согласования
Докладывать руководителю отдела о критической ситуации	Привлечь аутсорс без выделенного на это бюджета
Предлагать структурированные варианты решения проблемы	Самостоятельно сдвинуть срок релиза без согласования с клиентом
Перераспределять текущие задачи внутри проектной команды	—

Шаг 1. Разговор с дизайнером



Формат: Прямой видеозвонок

Почему звонок, а не переписка: В распределенной команде личные встречи невозможны. Письма воспринимаются холодно и не дают моментальной честной обратной связи. Звонок позволяет считать эмоции и задать жесткие вопросы.

«Привет. Давай созвонимся сегодня в 16:00 на 15 минут. Обсудим статус по макетам и сроки. Отправлю ссылку на Zoom.»

* Цель звонка — перевести общение из плоскости отговорок в плоскость конкретного плана действий.

Шаг 2. Ежедневный микроконтроль (7 дней)

Этап / День	Действие РМ	Ожидаемый результат
День 1	Стартовый звонок в 11:00. Разбор ситуации. Фиксация детального плана на 7 дней.	Дизайнер подписался под планом работы.
День 2	Короткий созвон (10 мин). Просмотр текущего прогресса в Figma.	Виден фактический сдвиг с мертвой точки.
День 3	Контрольная точка: детальная проверка промежуточных файлов проекта.	Подтверждена жизнеспособность макетов.
День 4 - 5	Ежедневный созвон в 11:00. Оценка общего прогресса (должно быть готово >50%).	Исключен риск откладывания на последний день.
День 6 - 7	Финальный статус по готовности. Принятие итоговых макетов.	Полный комплект файлов сдан в разработку.

| Шаг 3. Ожидания не равны реальности



День 1-2: Официальное предупреждение

При первых задержках на этапе микроконтроля фиксируем отклонение в письменном виде и предупреждаем о последствиях.



День 3-4: Сбор фактологии

Логирование переписок, задержек созвонов и процента выполнения задач в Figma. Подготовка доказательной базы.



День 5: Предварительное информирование руководителя отдела

Если прогресс по макетам составляет менее 50%, РМ обязан инициировать подготовку альтернативного решения.



День 7: Запуск плана Б

Макеты не сданы. Автоматический переход к эскалации на уровень топ-менеджмента для замены исполнителя.

Шаг 4. План Б — Фиксация и Эскалация

1. Сбор и фиксация фактов

PM готовит структурированное обоснование ущерба проекту для руководства:

-  Лог переписки и записей встреч
-  Обещанные сроки против фактических
-  **Расчет простоя:** 6 специалистов × 2 недели = 12 человеко-недель оплачиваемого бездействия команды разработчиков.

2. Обращение к руководителю отдела

Четкое формулирование проблемы и предложение готовых сценариев выхода:


-  **Вариант А:** Оперативно заменить дизайнера ресурсами внутри отдела.
-  **Вариант Б:** Выделить бюджет и отдать часть работы на аутсорс.
-  **Вариант В:** Пересогласовать сроки релиза с клиентом (худший сценарий).

Шаг 5. Работа с командой

«Коллеги, знаю, что вы ждете макеты. Есть задержка, я уже решаю этот вопрос. Чтобы не терять время, я подготовил для вас задачи по изучению ТЗ, настройке окружения и техническому дизайну. Как только дизайн будет готов — мы сразу взлетаем. Держу вас в курсе.»

Задачи коммуникации РМ:

- 🛡 **Снизить тревожность:** Команда видит, что РМ контролирует кризис.
- 🔄 **Минимизировать простой:** Переключение на подготовительные задачи.

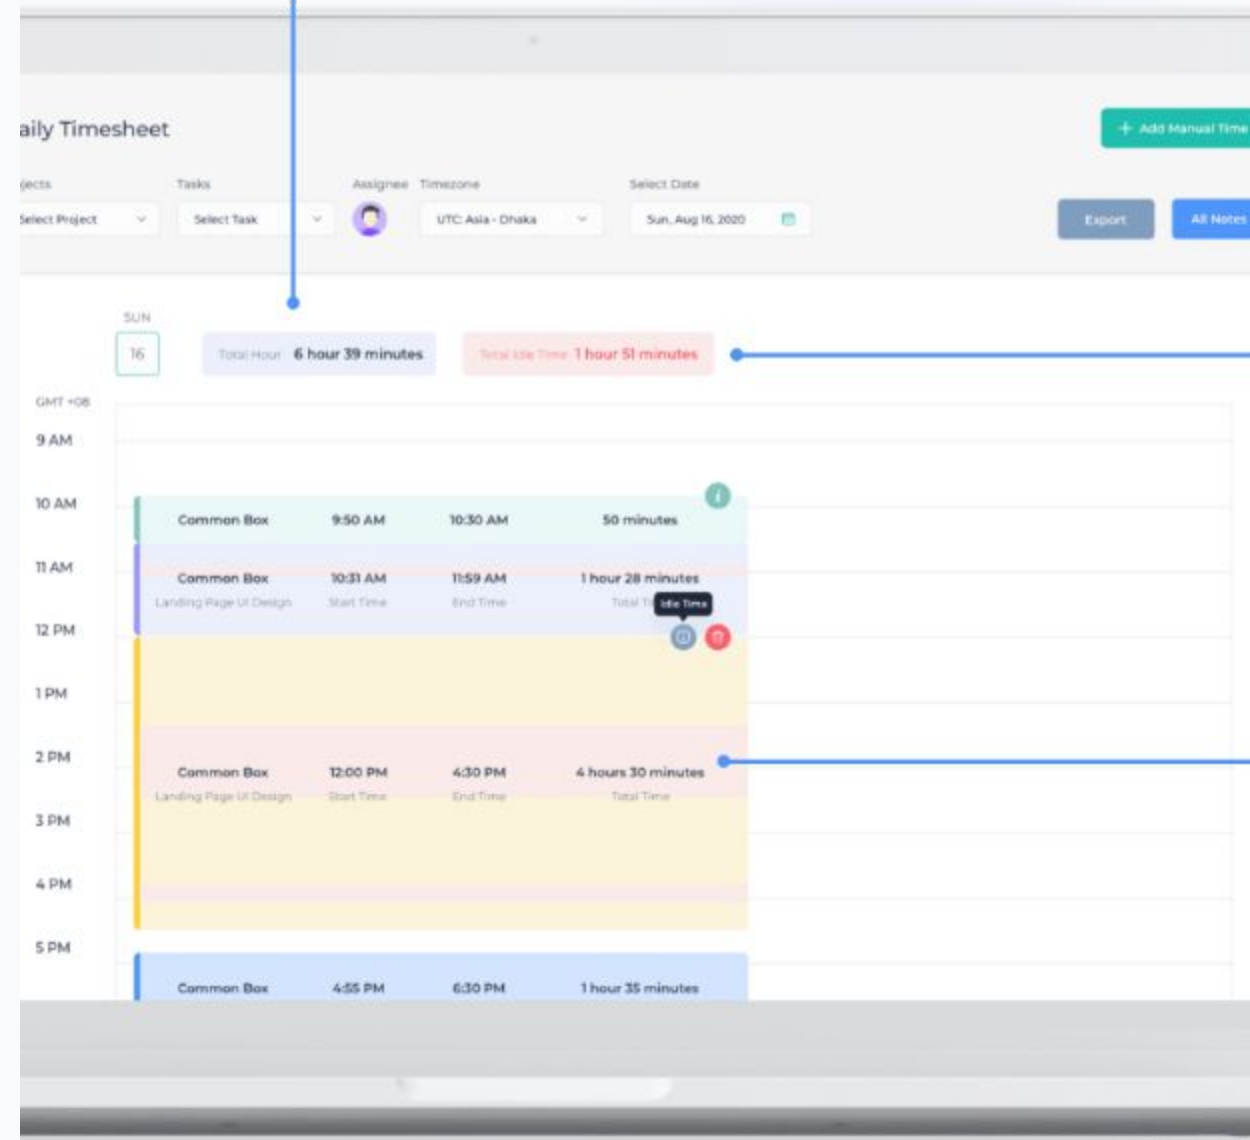

Шаг 6. Действия при худшем исходе



Отчет для топ-менеджмента

Фиксация причин срыва сроков. Описание финансового влияния простоя команды. Подтверждение мер со стороны РМ (хронология контроля и эскалации).



Переговоры с клиентом


Честный диалог о сдвиге сроков без перехода на личности («технические сложности»). Предоставление нового реалистичного графика и бонуса в качестве компенсации.



Внутренние выводы

Пересмотр воронки найма. Внедрение регламента обязательной промежуточной демонстрации прогресса раз в 3 дня для критически важных ролей.

Календарная стратегия восстановления (30 дней)

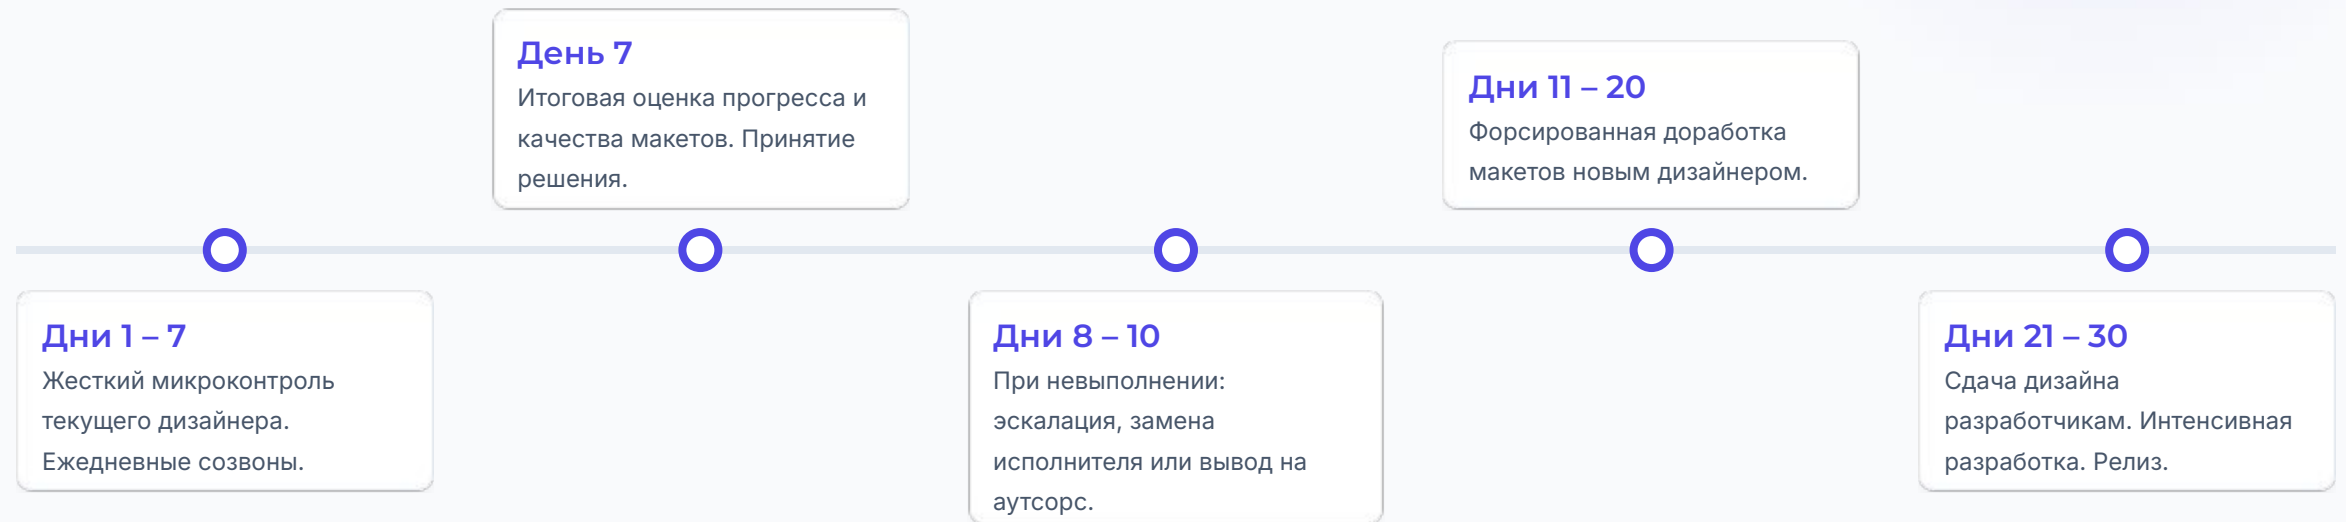

| Ключевые выводы для Project Manager



Не ждать чуда

Задержка в 2 недели сама по себе не исправится. В кризисе РМ обязан мгновенно забирать управление в ручной режим микроконтроля.



Решает фактология

Контроль эффективен только через твердые цифры, ежедневные встречи и демонстрацию прогресса, а не через обещания исправиться.



Эскалация — инструмент

В функциональной структуре РМ не наделен властью карать, но его прямая обязанность — вовремя поднять проблему наверх с расчетом потерь.
